

PROTOKÓŁ WYGRZEWANIA JASTRYCHU

Ogrzewanie płaszczyznowe podłogowe wg norm PN-EN 1264-4 oraz PN-EN 14336

Nr protokołu: [Numer/2026]

Data sporządzenia: [Data]

1. DANE IDENTYFIKACYJNE OBIEKTU I INSTALACJI

Inwestor:	[Imię i nazwisko / Firma]	Adres inwestycji:	[Ulica, Numer, Miasto]
Wykonawca instalacji:	[Nazwa firmy instalacyjnej]	Wykonawca jastrychu:	[Nazwa firmy posadzkarskiej]
Rodzaj spoiwa:	[] Cementowy [] Anhydrytowy	Grubość jastrychu:	[np. 65 mm / nad rurą 45 mm]
Data wylania jastrychu:	[Data zakończenia prac]	Data startu grzania:	[min. 21 dni cement / 7 dni anhydryt]
Źródło ciepła:	[Kocioł / Pompa ciepła / Grzałka]	Projektowa temp. zasil.:	T_max = [np. 45°C / 50°C]

Zasady normowe procedury wstępnej (PN-EN 1264-4): Wyrzewanie rozpoczyna się po pełnym związaniu spoiwa. Start następuje od temperatury zasilania rzędu **20°C–25°C** utrzymywanej przez 3 doby. Następnie temperaturę podnosi się maksymalnie o **5°C na dobę** aż do osiągnięcia maksymalnej temperatury projektowej, którą utrzymuje się przez minimum 4 doby. Wietrzenie bez przeciągów!


2. DZIENNIK PRZEBIEGU PROCESU WYGRZEWANIA (DNI 1 – 11)

Dzień	Data	Zadana temp. zas. [°C]	Rzeczywista temp. [°C]	Temp. wewn. [°C]	Etap procedury	Podpis
1	[Data]	20°C – 25°C	_____ °C	_____ °C	Start wygrzewania wstępnego	
2	[Data]	20°C – 25°C	_____ °C	_____ °C	Utrzymanie temp. początkowej	
3	[Data]	20°C – 25°C	_____ °C	_____ °C	Utrzymanie temp. początkowej	
4	[Data]	+5°C (np. 30°C)	_____ °C	_____ °C	Podnoszenie temperatury	
5	[Data]	+5°C (np. 35°C)	_____ °C	_____ °C	Podnoszenie temperatury	
6	[Data]	+5°C (np. 40°C)	_____ °C	_____ °C	Podnoszenie temperatury	
7	[Data]	T_max (np. 45°C)	_____ °C	_____ °C	Osiągnięcie temp. projektowej	
8	[Data]	T_max (np. 45°C)	_____ °C	_____ °C	Wyrzewanie na max. parametrze	
9	[Data]	T_max (np. 45°C)	_____ °C	_____ °C	Wyrzewanie na max. parametrze	
10	[Data]	T_max (np. 45°C)	_____ °C	_____ °C	Wyrzewanie na max. parametrze	
11	[Data]	-5°C (np. 40°C)	_____ °C	_____ °C	Stopniowe studzenie wylewki	

2. DZIENNIK PRZEBIEGU PROCESU WYGRZEWANIA (DNI 12 – 16 CD.)

Dzień	Data	Zadana temp. zas. [°C]	Rzeczywista temp. [°C]	Temp. wewn. [°C]	Etap procedury	Podpis
12	[Data]	-5°C (np. 35°C)	_____ °C	_____ °C	Stopniowe studzenie wylewki	
13	[Data]	-5°C (np. 30°C)	_____ °C	_____ °C	Stopniowe studzenie wylewki	
14	[Data]	-5°C (np. 25°C)	_____ °C	_____ °C	Stopniowe studzenie wylewki	
15	[Data]	-5°C (np. 20°C)	_____ °C	_____ °C	Osiągnięcie temp. wyjściowej	
16	[Data]	Wyłączenie / temp. robocza	_____ °C	_____ °C	Zakończenie cyklu głównego	

3. PROFIL TEMPERATUROWY WYGRZEWANIA (WYKRES SCHEMATYCZNY)

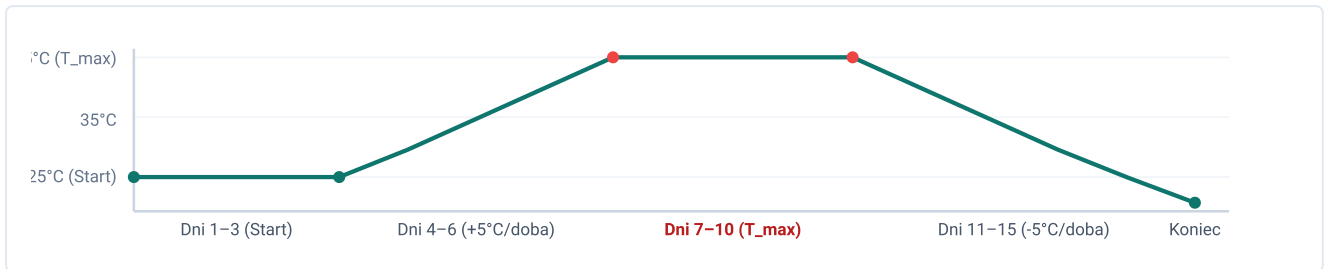

4. WYTTCZNE TECHNICZNE I WARUNKI PRZED UKŁADANIEM POSADZKI

- Wilgotność reszkowa (badanie CM):** Przed montażem okładziny wierzchniej (panele, drewno) wymagany jest pomiar wilgotności metodą karbidową (CM). Dopuszczalne wartości: wylewka cementowa $\leq 1,8\%$ (lub $\leq 1,5\%$ przy parkiecie); wylewka anhydrytowa $\leq 0,5\%$ (lub $\leq 0,3\%$ przy parkiecie).
- Temperatura podłoża przy montażu:** Montaż podłogi (klejenie płytek, desek) powinien odbywać się przy temperaturze powierzchni podłoża ok. 15°C–18°C. Po ułożeniu posadzki temperaturę tę utrzymuje się przez min. 3 dni.
- Oględziny wylewki:** Podczas i po zakończeniu wygrzewania stwierdzono brak rys, pęknięć oraz odkształceń w rejonie pól i szczelin dylatacyjnych.

5. OŚWIADCZENIE I PODPISY STRON

Wykonawca Instalacji C.O. _____ _____ Podpis i pieczęć	Wykonawca Posadzki / Kierownik _____ _____ Podpis i pieczęć	Inwestor / Zamawiający _____ _____ Data i czytelny podpis
--	---	---
